


<i>Localizzazione</i>		COMUNE di VARISELLA Provincia di TORINO				Approvazione Committente
<i>Committente</i>		Comune di Varisella Via Don Giocondo Cabodi, 4 10070 Varisella (TO)				
<i>Progetto</i>		PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CRONOPROGRAMMA INTERVENTI LOCALI DI RINFORZO STATICO DI N. 2 SOLAI DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ED OPERE CONNESSE				
<i>Dettaglio ubicazione</i>		via Don Giocondo Cabodi, 4 - 10070 Varisella (TO)				
		STUDIO TECNICO ASSOCIATO START Sede legale: via Jacopo. Durandi, 2 - 10144 Torino P.I. 11918080018				Validazione
PST E CSP		NICOLA Ing. MORDA' via Jacopo. Durandi, 2 - 10144 Torino P.I. 11918080018				
Coll.		ROBERTA arch. BUSATO via Jacopo. Durandi, 2 - 10144 Torino P.I. 11918080018				
						Verifica
<i>n. Ver.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione Contenuto</i>	<i>Redatto</i>	<i>Controllato</i>	<i>Approvato</i>	<i>Tip. In</i>
						B
						007
						PST
						D/E
						...
						CRP
						V01
<i>Scala</i>		<i>Nome file</i>		<i>Pos. Archivio informatico</i>	<i>Id Dossier</i>	

ID	Nome	Durata (g): 20,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Fasi di lavoro	20,00	[Barra grigia]																							
2	ALLESTIMENTO CANTIERE	20,00	[Barra grigia]																							
3	Realizzazione di recinzione di cantiere con pannelli in metallo e pannelli in cemento perimetrali	0,25	[Barra grigia]																							
4	Z.0 - AREA ESTERNA	0,25	[Barra grigia]																							
5	Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere	10,00	[Barra grigia]																							
6	Z.1 - PALESTRA	10,00	[Barra grigia]																							
7	Realizzazione balconcini di carico	0,75	[Barra grigia]																							
8	Z.0 - AREA ESTERNA	0,75	[Barra grigia]																							
9	Rimozione balconcini di carico	1,00	[Barra grigia]																							
10	Z.0 - AREA ESTERNA	1,00	[Barra grigia]																							
11	Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica)	1,00	[Barra grigia]																							
12	Z.0 - AREA ESTERNA	1,00	[Barra grigia]																							
13	OPERE EDILI	20,00	[Barra grigia]																							
14	DEMOLIZIONI-RIMOZIONI	18,00	[Barra grigia]																							
15	Rischi comuni per questa fase	18,00	[Barra grigia]																							
16	Montaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli	3,25	[Barra grigia]																							
17	Z.1 - PALESTRA	0,25	[Barra grigia]																							
18	Z.2 - UFFICI	0,25	[Barra grigia]																							
19	Scollegamento degli impianti esistenti	12,00	[Barra grigia]																							
20	Z.1 - PALESTRA	0,38	[Barra grigia]																							
21	Z.2 - UFFICI	0,50	[Barra grigia]																							
22	Z.3 - SOTTOTETTO	0,25	[Barra grigia]																							
23	Protezione scale e pavimenti interni con impiego di tavole e fogli di polietilene pesante	0,50	[Barra grigia]																							
24	Z.2 - UFFICI	0,50	[Barra grigia]																							
25	Rimozione di controsoffitti e opere in ctg;	2,00	[Barra grigia]																							
26	Z.1 - PALESTRA	2,00	[Barra grigia]																							
27	Esecuzione e rimozione delle puntellazioni di porzioni di	0,25	[Barra grigia]																							
28	Z.1 - PALESTRA	0,25	[Barra grigia]																							
29	Z.2 - UFFICI	0,25	[Barra grigia]																							
30	Rimozione di impianti (precedentemente scollegati),	12,75	[Barra grigia]																							

ID	Nome	Durata (g): 20,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
31	Z.1 - PALESTRA	1,88																								
32	Z.2 - UFFICI	1,00																								
33	Z.3 - SOTTOTETTO	0,50																								
34	Demolizione in breccia; scarico su automezzo con impianto di scarico	1,63																								
35	Z.1 - PALESTRA	0,75																								
36	Z.2 - UFFICI	0,50																								
37	Tagli di porzioni di pavimenti e relativo sottofondo per adeguamento strutture	1,38																								
38	Z.1 - PALESTRA	0,50																								
39	Z.2 - UFFICI	0,50																								
40	Rimozione e posa in opera di serramenti interni, opere di finitura	18,00																								
41	Z.2 - UFFICI	2,00																								
42	Z.3 - SOTTOTETTO	1,00																								
43	Rimozione di macerie	2,13																								
44	Z.1 - PALESTRA	2,13																								
45	Z.2 - UFFICI	1,00																								
46	Allestimento e posa dell'armatura	9,50																								
47	Z.1 - PALESTRA	0,75																								
48	Z.2 - UFFICI	0,50																								
49	Z.3 - SOTTOTETTO	0,75																								
50	Collocazione e rimozione delle cassetture in legno o pannelli in multistrato anche preaccoppiati	15,00																								
51	Z.1 - PALESTRA	1,75																								
52	Z.2 - UFFICI	0,13																								
53	Z.3 - SOTTOTETTO	1,75																								
54	Getto in calcestruzzo, in argilla espansa, calcestruzzo allargato e simili per caldaie isolanti, pendenze ecc.	9,25																								
55	Z.1 - PALESTRA	1,25																								
56	Z.2 - UFFICI	1,25																								
57	Z.3 - SOTTOTETTO	0,25																								
58	Posa in opera dell'isolante termico sui vuoti delle pignatte demolite all'interno	1,00																								
59	Z.1 - PALESTRA	1,00																								
60	Intonaci armati	2,00																								

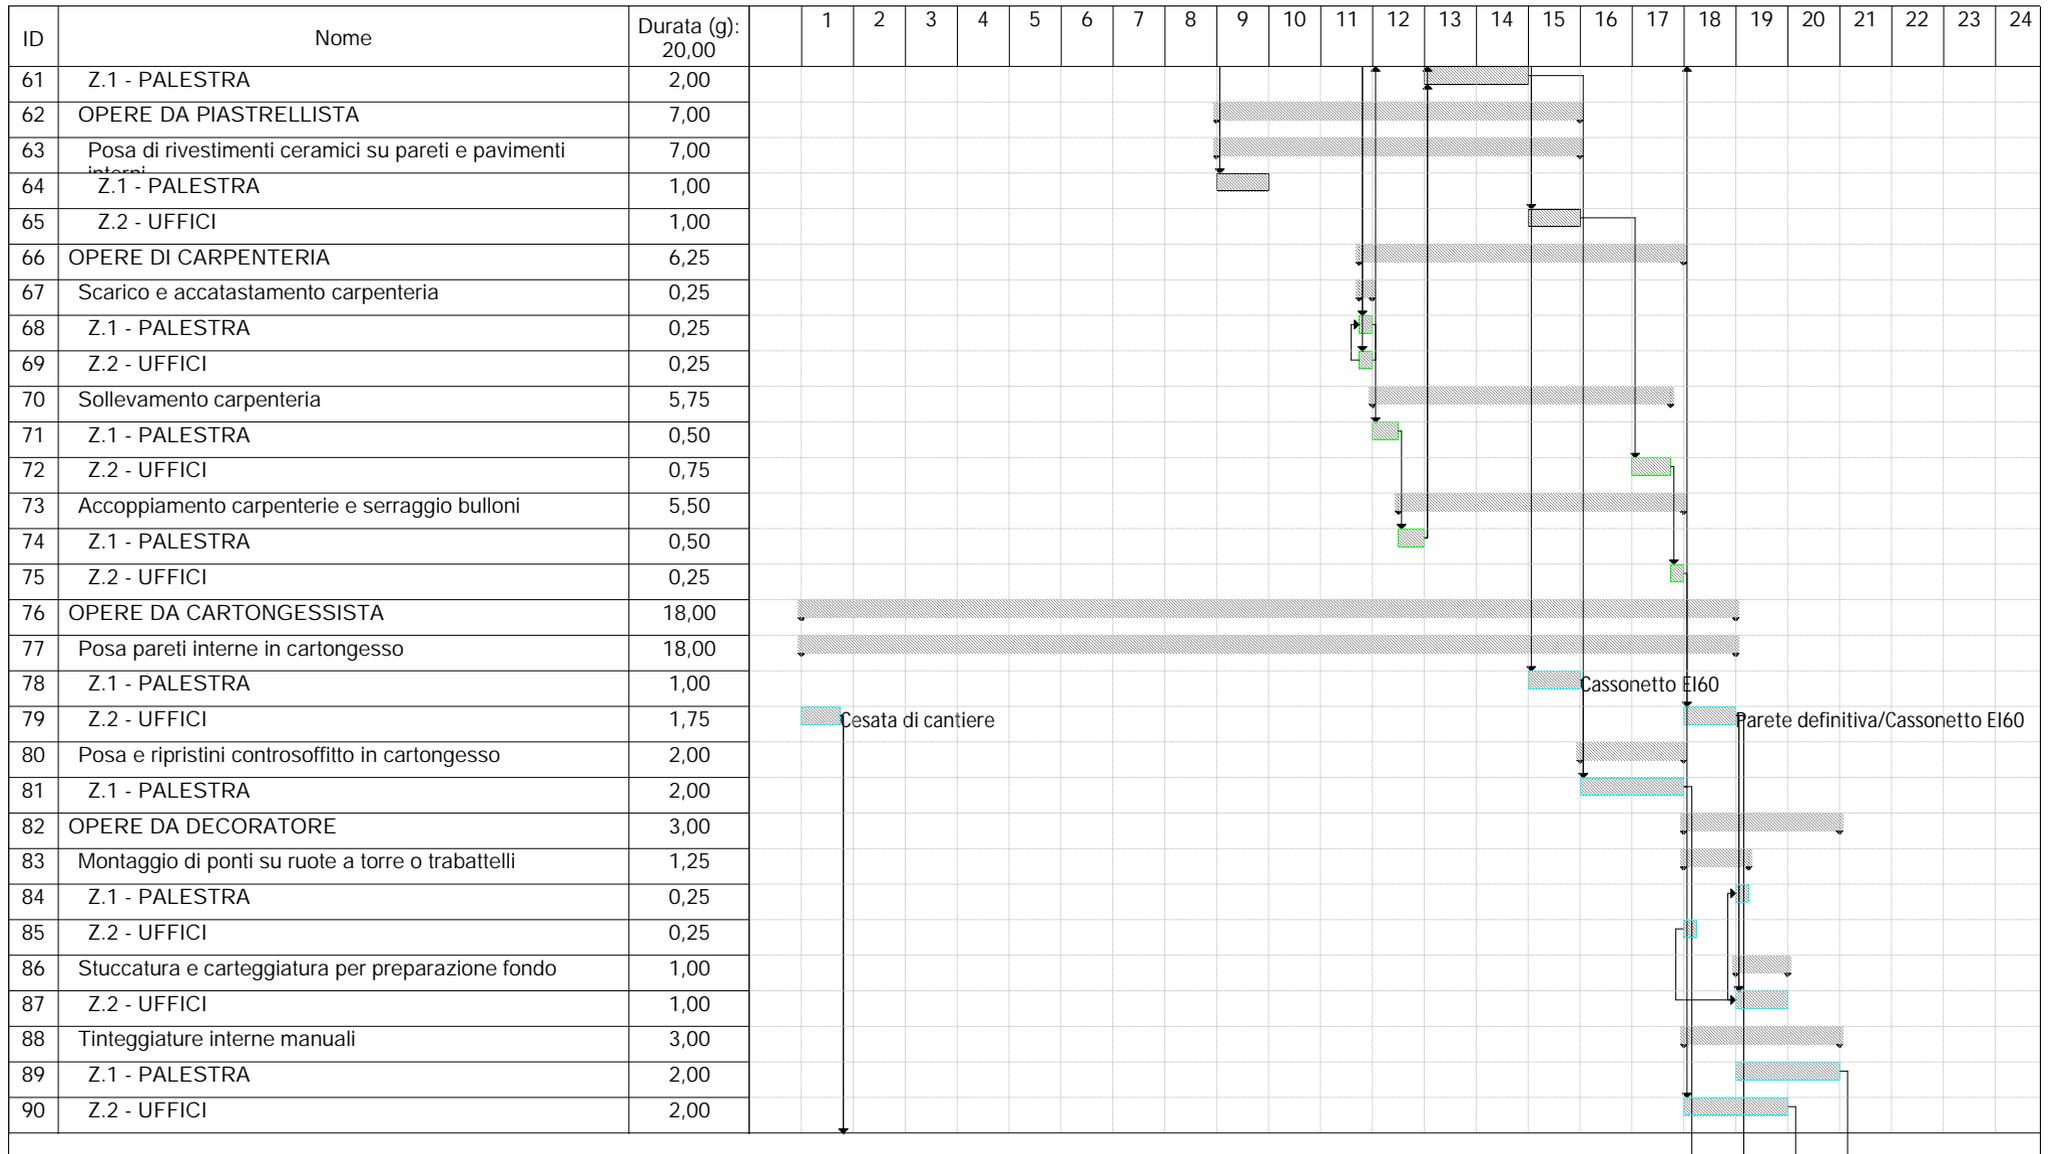

ID	Nome	Durata (g): 20,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
91	Smontaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli	1,25																								
92	Z.1 - PALESTRA	0,25																								
93	Z.2 - UFFICI	0,25																								
94	IMPIANTI ELETTRICI	18,75																								
95	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio	0,25																								
96	Z.1 - PALESTRA	0,25																								
97	Posa in opera della canalizzazione, tagli e fissaggio con malta e estero muro	17,25																								
98	Z.1 - PALESTRA	1,00																								
99	Z.2 - UFFICI	2,25																								
100	Z.3 - SOTTOTETTO	0,25																								
101	Inserimento fili	18,25																								
102	Z.1 - PALESTRA	1,00																								
103	Z.2 - UFFICI	1,25																								
104	Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto	6,75																								
105	Z.1 - PALESTRA	1,00																								
106	Z.2 - UFFICI	1,50																								
107	Z.3 - SOTTOTETTO	0,25																								
108	Installazione corpi illuminanti	16,25																								
109	Z.1 - PALESTRA	1,50																								
110	Z.2 - UFFICI	0,25																								
111	Collaudo impianto elettrico	2,25																								
112	Z.1 - PALESTRA	0,50																								
113	Z.2 - UFFICI	0,25																								
114	Smontaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli	2,25																								
115	Z.1 - PALESTRA	0,25																								
116	Z.2 - UFFICI	0,25																								

ID	Zona + Rumore	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Z.0 - AREA ESTERNA	77																			77				
2	Z.1 - PALESTRA	78		84			86		74	75	84			89	89	75	67	64	78	89	89				
3	Z.2 - UFFICI	85		84	81									86	78	75			91	90	78				
4	Z.3 - SOTTOTETTO													85	85	86					84				
